



LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Risultati e problemi aperti

1

Convegno "5 anni dopo" – 5 Aprile 2014



*Fine della gestione
commissariale e
NUOVA
GOVERNANCE
(AGOSTO 2012)*

La Nuova Governance

OBIETTIVO principale:

Superare la frammentazione degli interventi e collocarli in una prospettiva di medio periodo non puramente emergenziale.

Il rapporto OCSE ha evidenziato, tra gli altri, il tema del “non governo”, declinandolo nei temi:

- aspetti urbanistici, regolatori, dello sviluppo,
- sistemi di valutazione degli interventi, di controllo e monitoraggio degli interventi emergenziali.

*Istituzione
dell'Ufficio
Speciale per la
Ricostruzione
USRA*

Nel quadro dell'Intesa tra Governo centrale e locale, è costituito l'**USRA** per attuare e, laddove necessario, interpretare i principi della *Nuova governance*.

COMPITI PRINCIPALI

1. *istruttoria delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati*
2. *controllo e assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata*
3. *monitoraggio dell'impegno finanziario e attuativo degli interventi
verifica della qualità della ricostruzione*
4. *programmazione, valutazione, controllo, attivazione delle nuove procedure*
5. *garantire la trasparenza verso lo Stato (monitoraggio) ed i cittadini (open data)*

3



Concessione dei contributi per la RICOSTRUZIONE PRIVATA

NUOVA PROCEDURA

L'accesso alla quantificazione del contributo per la ricostruzione dell'edilizia privata è regolato da un **CRITERIO PARAMETRICO**.

Una *metodologia di determinazione del contributo* impostata su **PARAMETRI OGGETTIVI E TRASPARENTI** (danno, vulnerabilità, superfici, eventuale pregio ecc.) che permettono più rapidi **TEMPI DI VALUTAZIONE** impongono una **SOGLIA DI SICUREZZA**.

“SCHEDA PARAMETRICA”



Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila

SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO AL PROGETTO ESECUTIVO IN FORMATO DIGITALE
Versione aggiornata al 21 gennaio 2013

OGGETTO SCHEDA

COMUNE		LOCALITÀ		L'AGUILA	
numero F.A.O.G. (ES)	Sp	Indirizzo	Indirizzo	representato	Sezione

Realizzazione scheda a cura di:
 Comune dell'Aquila Assessorato alla Ricostruzione, Urbanistica e Pianificazione territoriale (assessore Paolo Di Stefano)
 Settore Pianificazione Urbana del Territorio e Ambientale (arch. Chiara Santoro)
 Settore erogazione Servizi Ricostruzione privata (ing. Alfonso Fabiani)

Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Comune di L'Aquila - 67017 Poggio Asti

SS.A.C.
 Struttura Speciale Area Consulenza
 Coordinatore Daniele Scaroni, Paolo Angelini, Alberto Chiodini, Benedetto Ciani, Roberto Di Marco, Maurizio Pirozzi, Diego Pizzi, Alberto Santoro, Silvano Mariani, Gianluca Petrucci

Realizzazione in formato digitale a cura di Alberto Santoro e Gianluca Petrucci

Pagina 1

*Procedura
parametrica*

***EFFETTI
PRINCIPALI***

EFFETTI PRINCIPALI

1. Significativa **RIDUZIONE DEI COSTI** (La valutazione della ricostruzione del centro storico passa da 5.7 miliardi di euro del PdR ai 4.8 mld attuali con possibilità di ulteriore riduzione)
2. Drastica **RIDUZIONE DELLA DISCREZIONALITÀ** da parte dei valutatori (omogeneità dei criteri)
3. **PROGRAMMAZIONE DEGLI IMPEGNI FINANZIARI** che lo Stato dovrà sostenere
4. **CERTEZZA DEI RIFERIMENTI TEMPORALI** (scadenza presentazione dei progetti: 5 aprile 2014)

5



Monitoraggio e implementazione

BANCHE DATI

Organizzazione di un sistema di raccolta e organizzazione informatica dei dati, integrato con la **Banca Dati Emergenza (BDE)** del Comune di L'Aquila: **Rendere l'iter di ciascuna pratica tracciabile e trasparente**

(in collaborazione con Comune, SED, Università)

Implementazione della **piattaforma di gestione e monitoraggio della ricostruzione** per la consultazione *on-line* dello **stato delle pratiche** su tutto il territorio comunale: ciascun cittadino può acquisire le informazioni essenziali sullo stato dell'istruttoria relativa alle singole unità immobiliari e agli edifici e visualizzare lo stato di avanzamento della ricostruzione di tutte le località del comune di L'Aquila.





Monitoraggio e
implementazione
BANCHE DATI

L'integrazione del Sistema di:

1. Valutazione

2. Organizzazione (USRA vs Filiera, STM ecc.)

3. Monitoraggio

delle **PROCEDURE** e dei **CARICHI DI LAVORO**
(del Comune e del Genio Civile in particolare)

ha permesso di incrementare
P'EFFICACIA della Nuova Governance

Costituendo l'essenziale presupposto per la determinazione del fabbisogno reale con l'arco temporale di riferimento e, quindi, delle relative richieste da sottoporre al Governo e all'Amministrazione Centrale.

7



Spese per l'emergenza e la ricostruzione al 31/12/2013

Spese per l'emergenza e la ricostruzione- € 9.685 mln

COMUNE DELL'AQUILA

Ricostruzione privata - 2.628 mln €

Ricostruzione pubblica - 1.365 mln €


COMUNI DEL CRATERE

Ricostruzione privata - 1.242 mln €

COMUNI DELL'AQUILA E DEL CRATERE

Spese emergenza - 2.861 mln €

ALTRO - 1.589 mln €

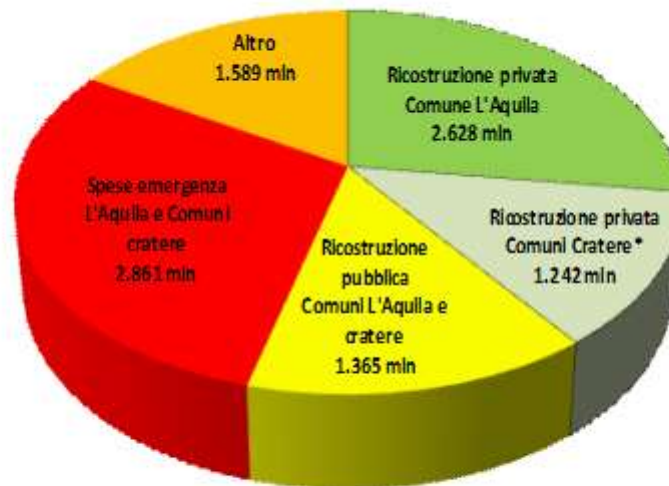


*dato stimato

**COSTI
STORICI**

al 31/12/2013


Tabella costi storici	
	FINO AL 2013
	mln €
Ricostruzione privata Centro storico capoluogo e frazioni AQ	615
Ricostruzione privata Periferie AQ	2.013
Ricostruzione privata - AQ	2.628
Ricostruzione privata – Cratere*	1.242
Ricostruzione pubblica (AQ+Cratere)	1.365
Spese obbligatorie e assistenza tecnica (AQ+Cratere)	175
Sviluppo	40
Totale ricostruzione	5.450
Spese emergenza (AQ+Cratere)	2.861
Altro (INAIL, Riequilibrio bilanci, CIG ecc.)	1.374
TOTALE	9.685

*dato stimato



Monitoraggio degli interventi di ricostruzione privata

*Monitoraggio
interventi
RICOSTRUZIONE
PRIVATA*

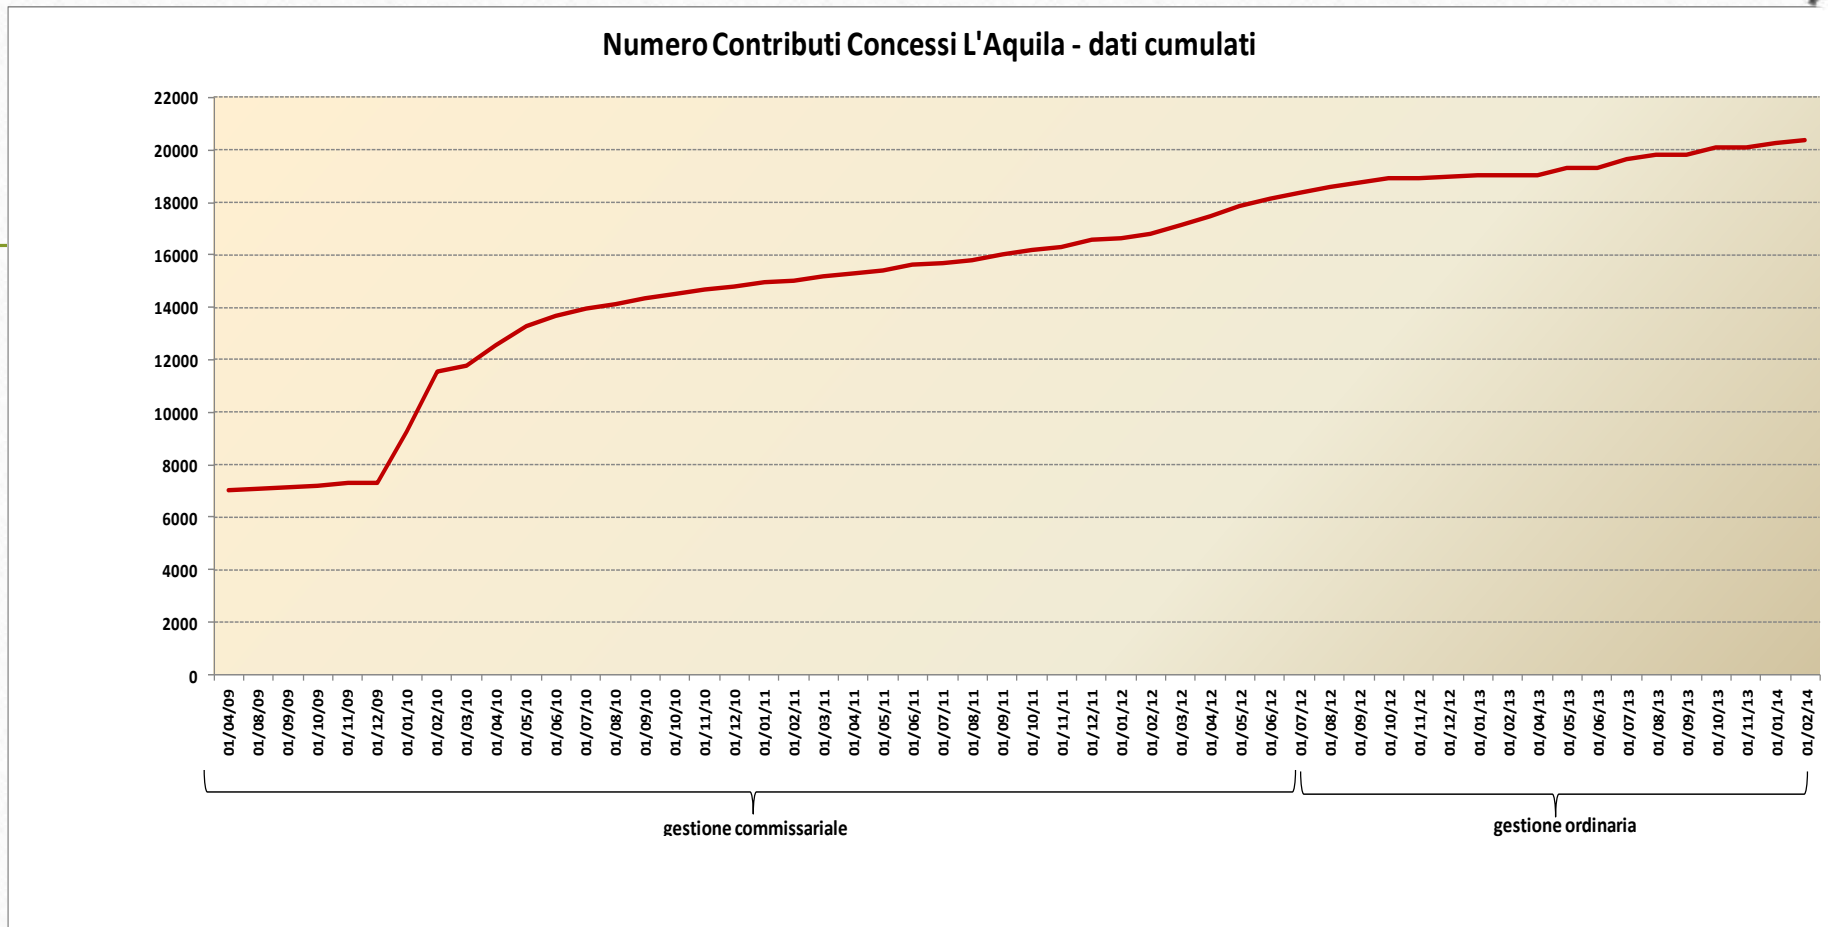


Contributi: oltre 20.000






*Importo contributi
dati cumulati
L'Aquila*

Importo Contributi L'Aquila - dati cumulati

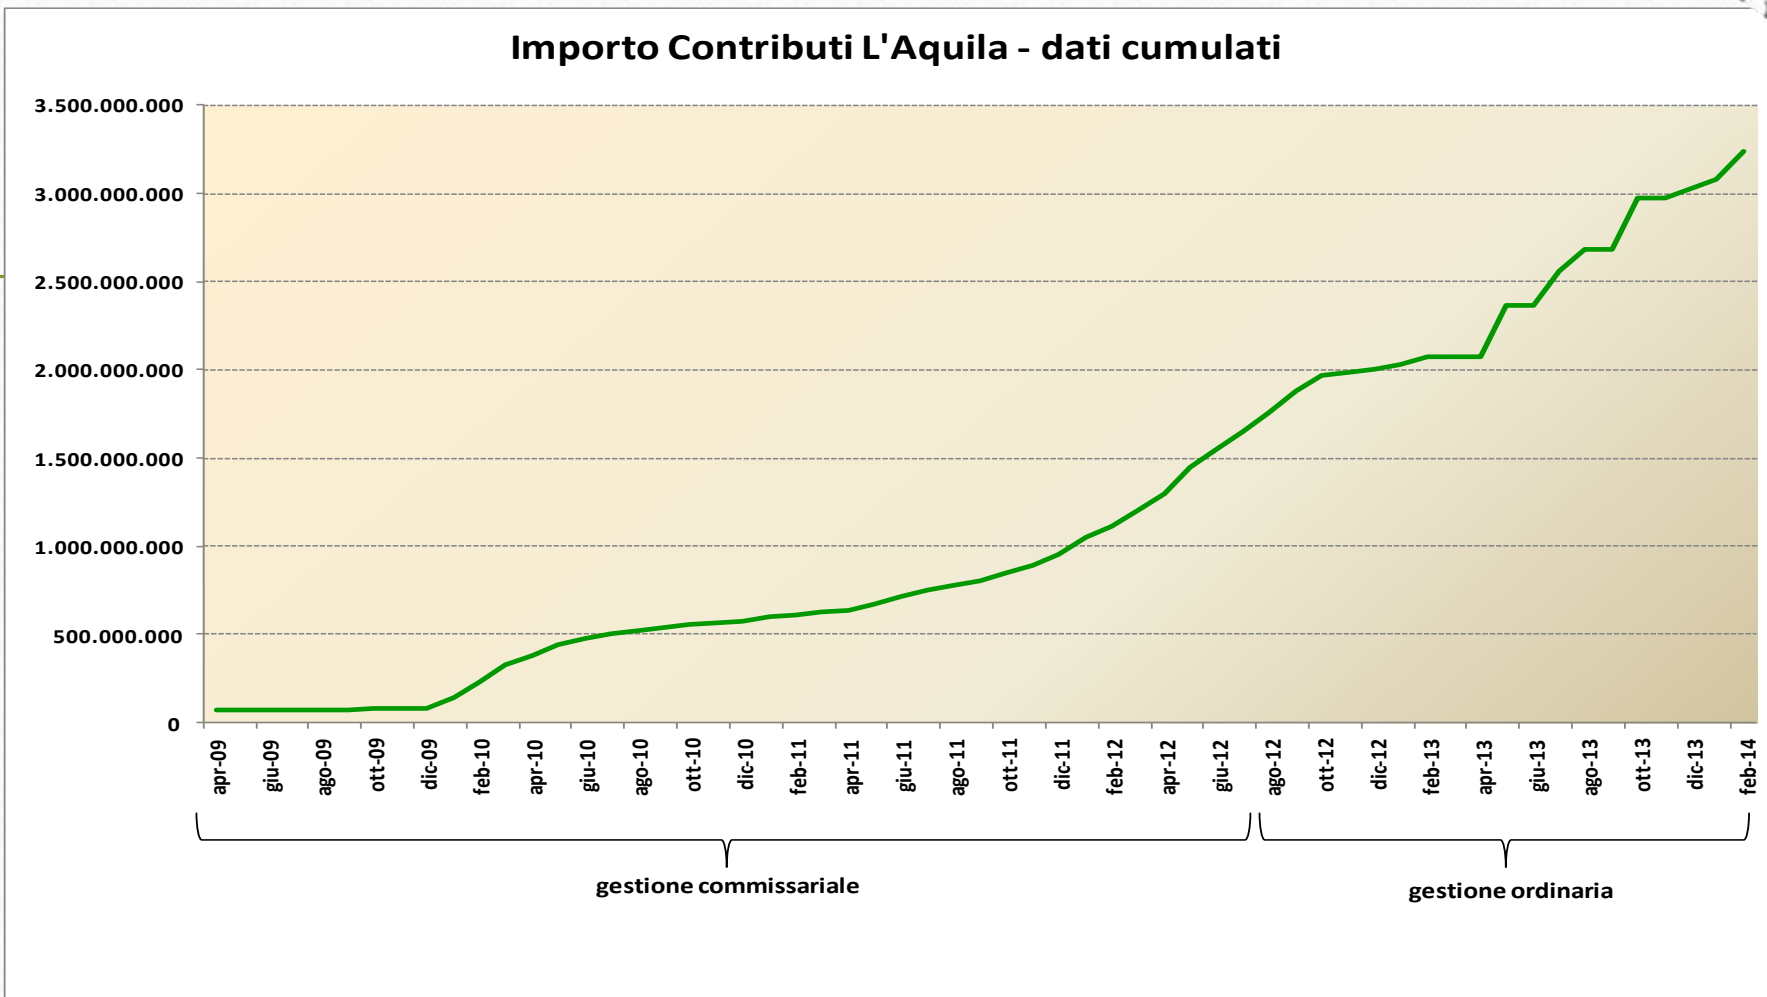

Monitoraggio ex DM MEF 29/10/2012 Contributi importi L'Aquila

Monitoraggio ex DM MEF 29.10.2012 - L'Aquila: Contributi Importi - Dettaglio

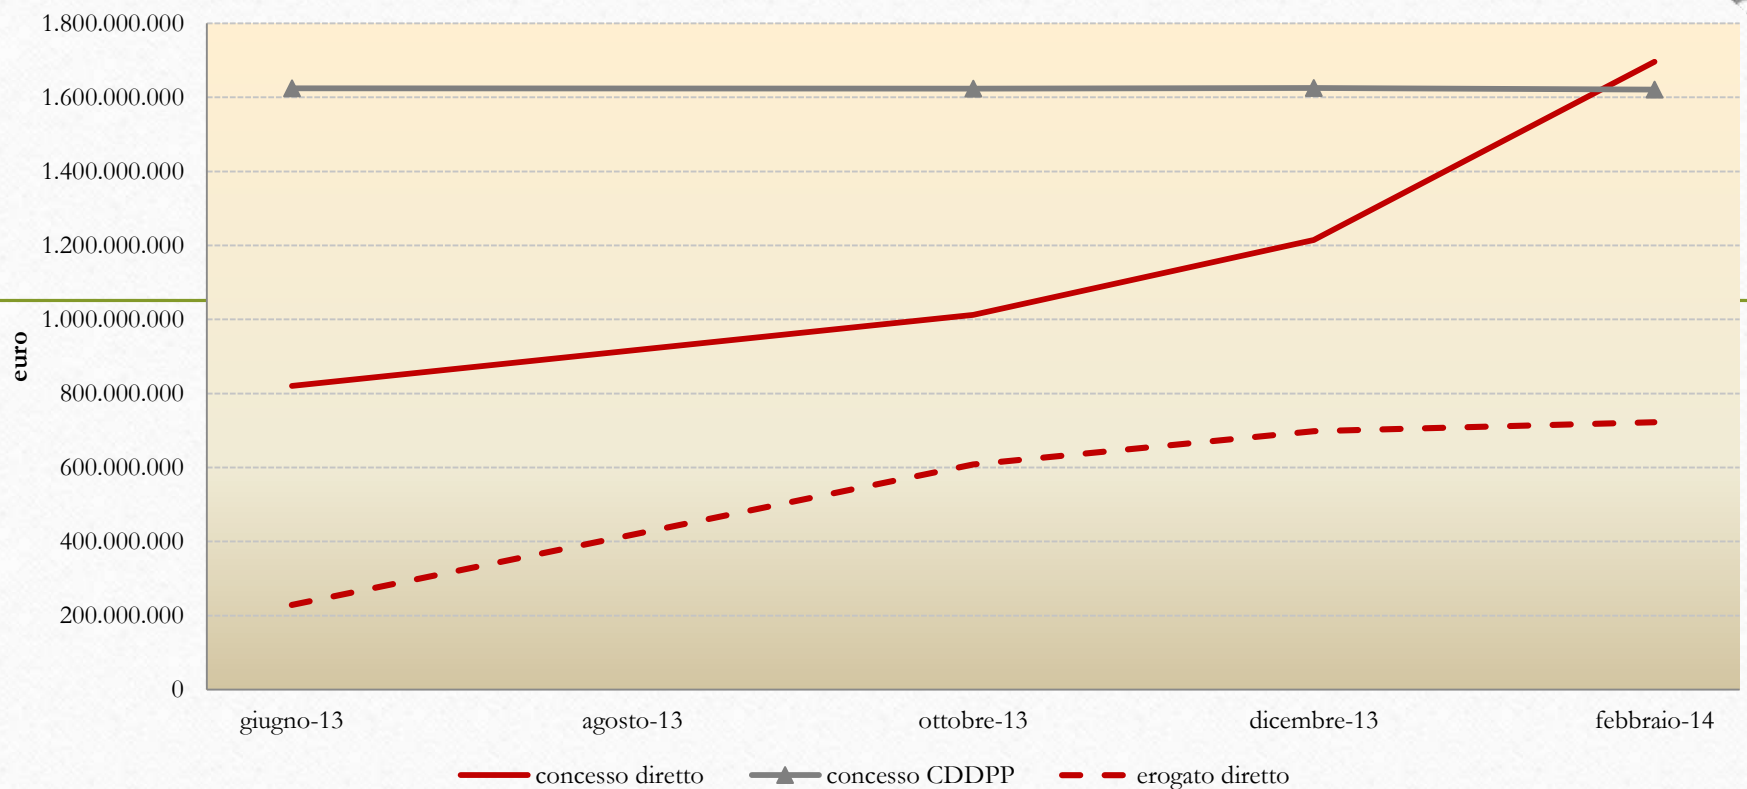


- Nell'ultimo anno sono stati **CONCESSI CONTRIBUTI** per un **IMPORTO PARI a 1.5 mld**
- Criticità: Il problema "tecnico" fondamentale è la gestione finanziaria, il paradosso di un *surplus di cassa* da non poter impiegare per i pagamenti



*Monitoraggio ex
DM MEF
29/10/2012
Interventi conclusi
L'Aquila*

Monitoraggio ex DM MEF 29.10.2012 - L'Aquila: Interventi conclusi

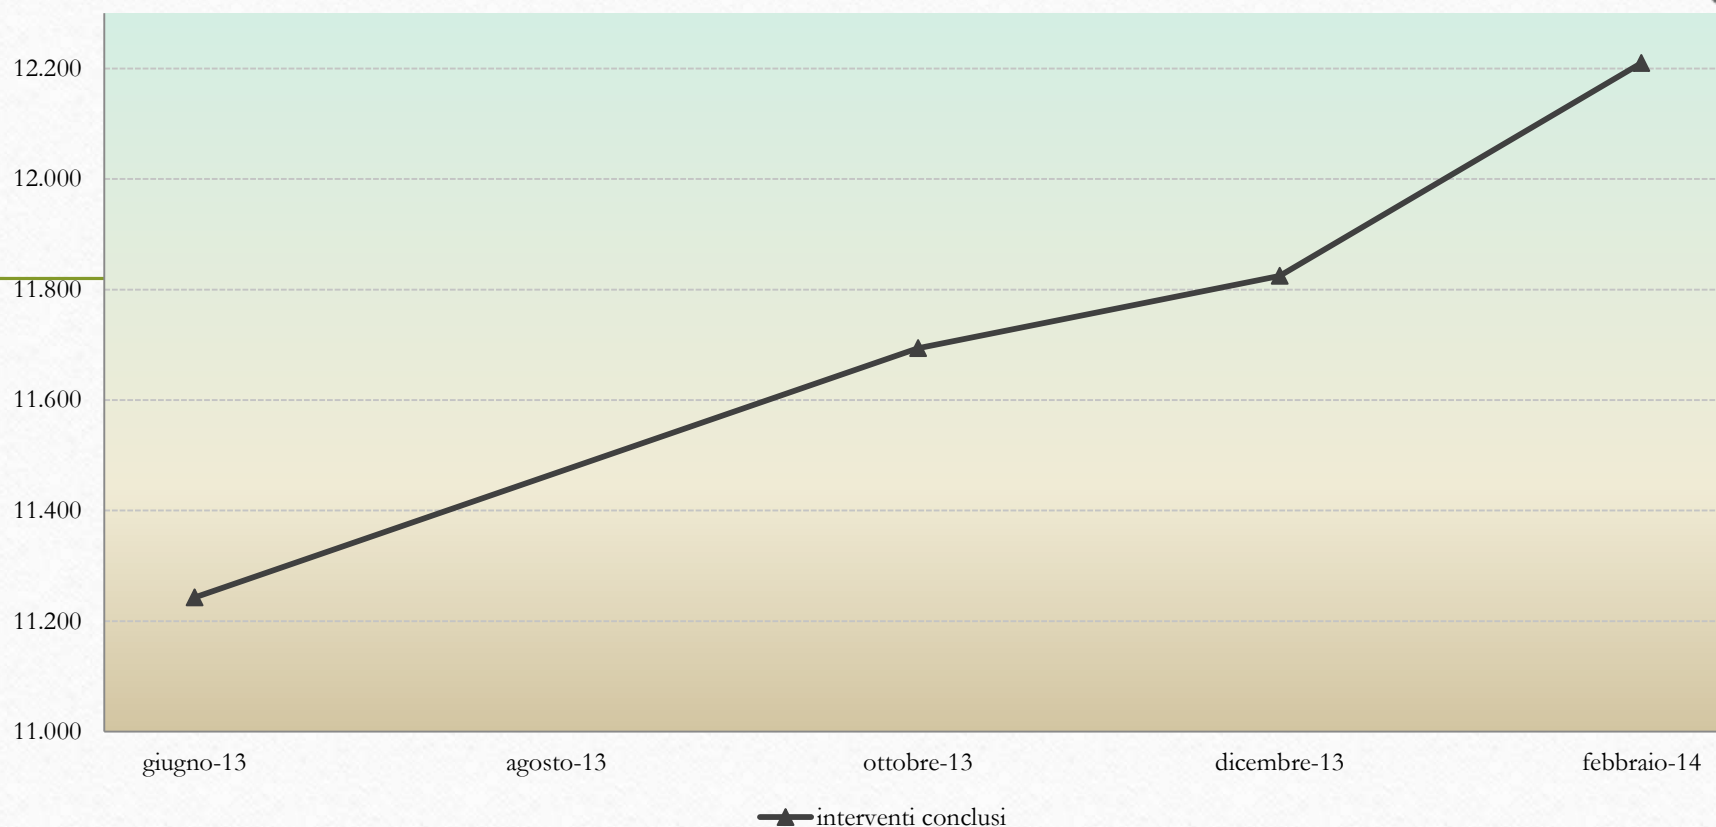

- Nell'ultimo anno sono stati **CONCESSI CONTRIBUTI** per un **IMPORTO PARI** a quello concesso nei **QUATTRO ANNI** precedenti
- Criticità: Il problema "tecnico" fondamentale è la gestione finanziaria, il paradosso di un *surplus di cassa* da non poter impiegare per i pagamenti

Dalla visione di
breve periodo, a
quella di medio e
lungo periodo

La **Delibera CIPE n. 135/2012** fissa il quadro del **triennio 2013 - 2015**, e per la prima volta nei documenti di lavoro appare una valutazione del **fabbisogno complessivo atteso** per la gestione di:

- *Ricostruzione privata*
- *Ricostruzione pubblica*
- *Spese emergenziali*

Si supera la visione di breve periodo preferendo un:

PROGETTO

CONDIVISO (stakeholders, PAC e PAL) e

CONTROLLABILE (Ministero dell'Economia, cittadini)

14

RISORSE RICOSTRUZIONE PRIVATA L'AQUILA: ASSEGNAZIONI E IMPEGNI		2009-2012	2012-2013	2013	2014	2015	2016	2017
		mln	mln	mln	mln	mln	mln	mln
D.L. 39/2009 - Delibera CIPE 95/2009 - Trasferimenti DPC e Commissario Delegato	assegnazioni	133.92						
	impegni	133.92						
D.L. 39/2009 - Delibera CIPE 43/2012	assegnazioni		210.90					
	impegni		210.90					
D.L. 39/2009 - Delibera CIPE 135/2012 - Annualità 2013	assegnazioni			660.00				
	impegni			660.00				
D.L. 39/2009 - OPCM 4013/2012 - Annualità 2013	assegnazioni			/				
	impegni			/				
Delibera CIPE 135/2012 - Annualità 2014	assegnazioni				167.00			
	impegni				167.00			
OPCM 4013/2012 - Annualità 2014	assegnazioni				/			
	impegni				/			
D.L. 43/2013 - Delibera CIPE 50/2013 - Annualità 2014	assegnazioni				114.00			
	impegni				114.00			
D.L. 147/2013 (Legge stabilità) - Annualità 2014	assegnazioni				180*			
	impegni				98.00			
D.L. 39/2009 - Delibera CIPE 135/2012 - Annualità 2015	assegnazioni					158.00		
	impegni					154.50		
D.L. 43/2013 - Delibera CIPE 50/2013 - Annualità 2015	assegnazioni					114		
	impegni					19		
D.L. 147/2013 (Legge stabilità) - Annualità 2015	assegnazioni					180*		
	impegni					0		
CIPE 50 Annualità 2016	assegnazioni						114	
	impegni						61	
CIPE 50 Annualità 2017	assegnazioni							114
	impegni							0
CIPE 50 Annualità 2018	assegnazioni							
	impegni							
CIPE 50 Annualità 2019	assegnazioni							
	impegni							
TOTALE ASSEGNAZIONI		133.92	210.90	660.00	461.00	452.00	114.00	114.00
TOTALE IMPEGNI		133.92	210.90	660.00	379.00	173.50	61.00	0.00

dato stimato





Assegnazione e impegni ricostruzione privata del Comune L'Aquila

CRITICITA'

Assegnazione e
impegni
RICOSTRUZIONE
PRIVATA
CRITICITA'
Comune L'Aquila

1. Impegno immediato dei circa 160 mln ancora disponibili (aprile)
2. Necessità di una Delibera CIPE che attivi gli **ulteriori stanziamenti** della Legge di Stabilità (40 mln di euro per il 2014 e 180 mln di euro per il 2015)
3. Necessità **dell'erogazione dei fondi stanziati con l'OPCM 4013/2012**, soprattutto per le spese obbligatorie
4. Possibilità di attivare gli interventi di ricostruzione in anticipazione (le tre annualità della CIPE 50 dal 2017 al 2019)
5. Gestione della cassa, in conformita' agli impegni autorizzati dal CIPE, coerente all'andamento dei cantieri

Convegno "5 anni dopo" – 5 Aprile 2014

16

Convegno "5 anni dopo" – 5 Aprile 2014



**PRIORITA'
DEGLI
INTERVENTI
L'Aquila**

La visione di medio/lungo periodo e l'adozione del metodo della programmazione, hanno consentito di **determinare i costi** ed il **fabbisogno residuo** per la **RICOSTRUZIONE PRIVATA** di L'Aquila e dei comuni del Cratere

I **dati raccolti nella BDE** e il **nuovo metodo parametrico** consentono di valutare il **fabbisogno residuo massimo** per la ricostruzione del centro storico di **L'Aquila** e delle sue frazioni in **4,8 mld di euro**, di cui **3,5 mld di euro prioritari** (rispetto ad una stima del PdR di 5,7 mld), sulla base dei seguenti elementi:

- ❑ **Il valore dei progetti presentati** (in istruttoria o istruiti), esclusi quelli con copertura finanziaria, ammonta a circa **3.500 milioni** (al netto delle riduzioni prevedibili al termine della fase istruttoria) include i **progetti relativi a centri storici e periferie di L'Aquila e frazioni** al 31.12.2013 (Filiera, Soprintendenza, USRA e Comune) e riguarda circa il **97%** degli aggregati del c.s. del **capoluogo** ed il **60%** dei c.s. delle **frazioni**;
- ❑ **Il valore dei progetti non ancora presentati è stimato in circa 1.300 milioni di euro** che si riferisce alle **aree urbane dei c.s. delle frazioni**.

**PRIORITA'
DEGLI
INTERVENTI**

L'Aquila

Secondo i criteri prima richiamati:

- Il valore degli **INTERVENTI PRIORITARI** per ultimare la ricostruzione di tutto il centro storico del capoluogo e del **60%** dei centri storici delle frazioni si attesta intorno ai 3,5 mld di euro.

- Si potrebbe attribuire una **PRIORITÀ MINORE** nel quadro generale del processo di ricostruzione, stimata in circa 1,3 mld di euro che si riferisce agli interventi nelle aree urbane dei c.s. delle frazioni e a quelli presentati relativi ad abitazioni secondarie o comunque non abitate al momento del sisma.

**PRIORITA'
DEGLI
INTERVENTI**

*Comuni del
Cratere*



La valutazione del **fabbisogno residuo prioritario** per la **RICOSTRUZIONE PRIVATA** dei **comuni del Cratere** - pari ad **1,8 mld di euro** –

si basa sui seguenti elementi:

- ❑ Al 31.12.2013 risultano approvati **23 su 56 PdR**. Nel corso dei prossimi mesi è prevista l'approvazione dei rimanenti 33. Costo complessivo dei PdR: **3,5 mld di euro**.
- ❑ Entro febbraio è previsto l'impegno dei **460 mln di euro della Delibera CIPE 135/2012**.
- ❑ Valore degli interventi di ricostruzione delle **abitazioni principali: circa 1,8 miliardi di euro**.
- ❑ Ulteriori **1.700 mln di euro** riguardano abitazioni secondarie e altri manufatti con una diversa priorità.



**PRIORITA'
DEGLI
INTERVENTI**

*Comuni del
Cratere*

Sulla base degli elementi sopra richiamati:

- Il valore degli **INTERVENTI PRIORITARI** per ultimare la ricostruzione dei Comuni del Cratere si attesta intorno ai **1,8 mld di euro**.
- Il **fabbisogno residuo prioritario** per la **ricostruzione privata** nei **comuni fuori Cratere** è stimato in **200 mln di euro**.

**IMPEGNI
PRIORITARI**
*Articolazione
pluriennale*

SINTESI NECESSITA'	Esigenze di impegno 2014 (MLN DI €)	previsioni impegni prioritari 2015 (MLN DI €)	previsioni impegni prioritari 2016 (MLN DI €)
ricostruzione privata comune aq	1.300	1.200	1.000
ricostruzione privata comuni cratere	600	600	600
ricostruzione privata comuni fc	200		
Totale ricostruzione privata	2.100	1.800	1.600
ricostruzione pubblica aq - nuovi interventi (comprende MIT e MIBAC)	280	240	160
ricostruzione pubblica comuni del cratere - nuovi interventi	100	100	100
ricostruzione pubblica comuni fuori cratere	0		
ATER e ERP L'Aquila	75	35	35
ATER e ERP Cratere e fuori cratere	5	5	5
Totale ricostruzione pubblica	460	380	300
spese obbligatorie (ESPROPRI INCLUSI) e assistenza tecnica L'Aquila	150	80	50
spese obbligatorie e assistenza tecnica comuni del Cratere	30	20	20
spese obbligatorie e assistenza tecnica comuni fuori cratere			
totale spese obbligatorie e ass. tec.	180	100	70
TOTALE GENERALE	2.740	2.280	1.970
Sviluppo (5% circa)	100	100	100

*Fabbisogno
prioritario*

Considerando il solo **fabbisogno "prioritario"** si ottiene un valore complessivo di **5,3 miliardi**.

Date le **coperture finanziarie**:

Legge di stabilità 2013 per **490 mln di euro** (circa 110 mln per coprire una quota di ricostruzione pubblica e di assistenza alla popolazione)

D.L. 43/2013 per **1,1 mld di euro** (interamente dedicata alla ricostruzione privata)

Le **coperture ulteriori** necessarie per la gestione della **fase prioritaria** della sola **ricostruzione privata**, secondo i criteri qui richiamati, ammontano a circa **3,7 mld di euro**

EDILIZIA SCOLASTICA

Riparazione edifici scolastici danneggiati dal sisma

Tipologia edifici scolastici interessati:

scuole primarie e scuole secondarie inferiori del Comune di L'Aquila

Prima Assegnazione: **circa 37 milioni di euro**

di cui **12 milioni di euro** + **19 milioni di euro** dal decreto n. 48/2013 del Titolare della Gestione Stralcio e **6,3 milioni di euro** dalla delibera CIPE n. 135/2012

e ulteriori **6 milioni** (assegnati al P.OO.PP.)

Enti coinvolti: Comune L'Aquila

Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

SOTTOSERVIZI

Intervento Iniziale – gestione commissariale - emergenza

Fonte di finanziamento: Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione n. 24/2010

- Tipologia intervento: riparazioni puntuali sulle reti idriche e fognarie nel centro storico della Città dell'Aquila
- Enti coinvolti: Gran Sasso Acqua SpA
- Prima Assegnazione: **27 milioni di euro**
- Rete interessata: circa 34.000 metri di rete idrica

SOTTOSERVIZI

Nuovo Intervento – gestione ordinaria

Fonte di finanziamento: Delibera CIPE 135/2012

Tipologia intervento: interrimento di tutti i sottoservizi e rifacimento delle 5 reti

Assegnazione: **80 milioni di euro**


- Enti coinvolti: Gran Sasso Acqua SpA (coordinatore) e Aziende di servizi presenti sul territorio

- Rete interessata: circa **43.000 metri di reti idriche, fognarie, elettriche, telecomunicazioni e gas**

- Stato di avanzamento: **affidato primo lotto di lavori** (importo: **27 milioni di euro**; 17.000 metri di reti - acquedotto, fognature, rete elettrica, telecomunicazioni, fibre ottiche - 15.000 metri di gallerie)

- **emanato il bando** per l'affidamento dei lavori per il **secondo lotto**.

Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

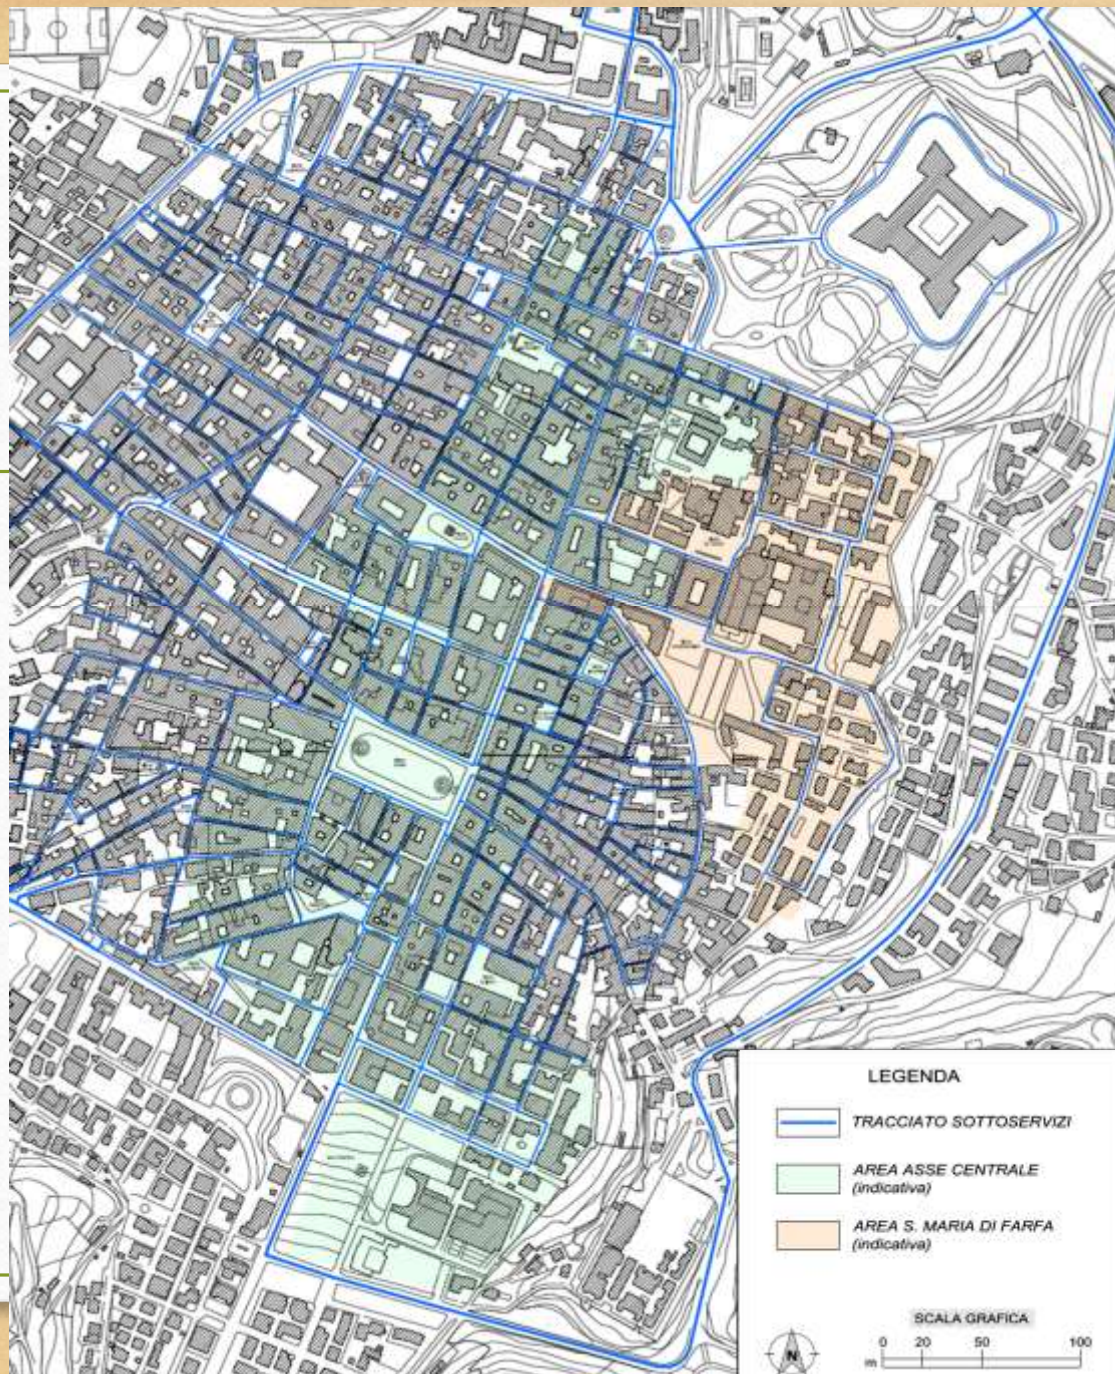

Primo lotto – Sottoservizi
Progetto preliminare

Planimetria

INTERVENTO DI RICOSTRUZIONE DELLE INFRASTRUTTURE NELL'AMBITO URBANO DEL "CENTRO STORICO" DELLA CITTA' DELL'AQUILA

SOTTOSERVIZI

Prodotto da: Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila	Coordinato da: Ufficio Tecnico S.A.S.
Autore:	Autore:
Tavola: 1/1	Progetto: PLANIMETRIA GENERALE E SOTTOSERVIZI RELATIVI ALL'ASSE CENTRALE
Scala:	Scala:

RETI

Rete elettrica per il comune dell'Aquila e di 2 comuni del cratere: rifacimento in ottica **smart grid**


- **35.000** utenze
- Assegnazione: **16 milioni di euro**
- Ente coinvolto: Enel

Rete metropolitana della P.A. a cura dell'Università

Ricostruzione privata e reti tecnologiche finalmente viaggiano di pari passo

Ricostruzione
Pubblica
(luci ed ombre)

L'AQUILA SMART CITY

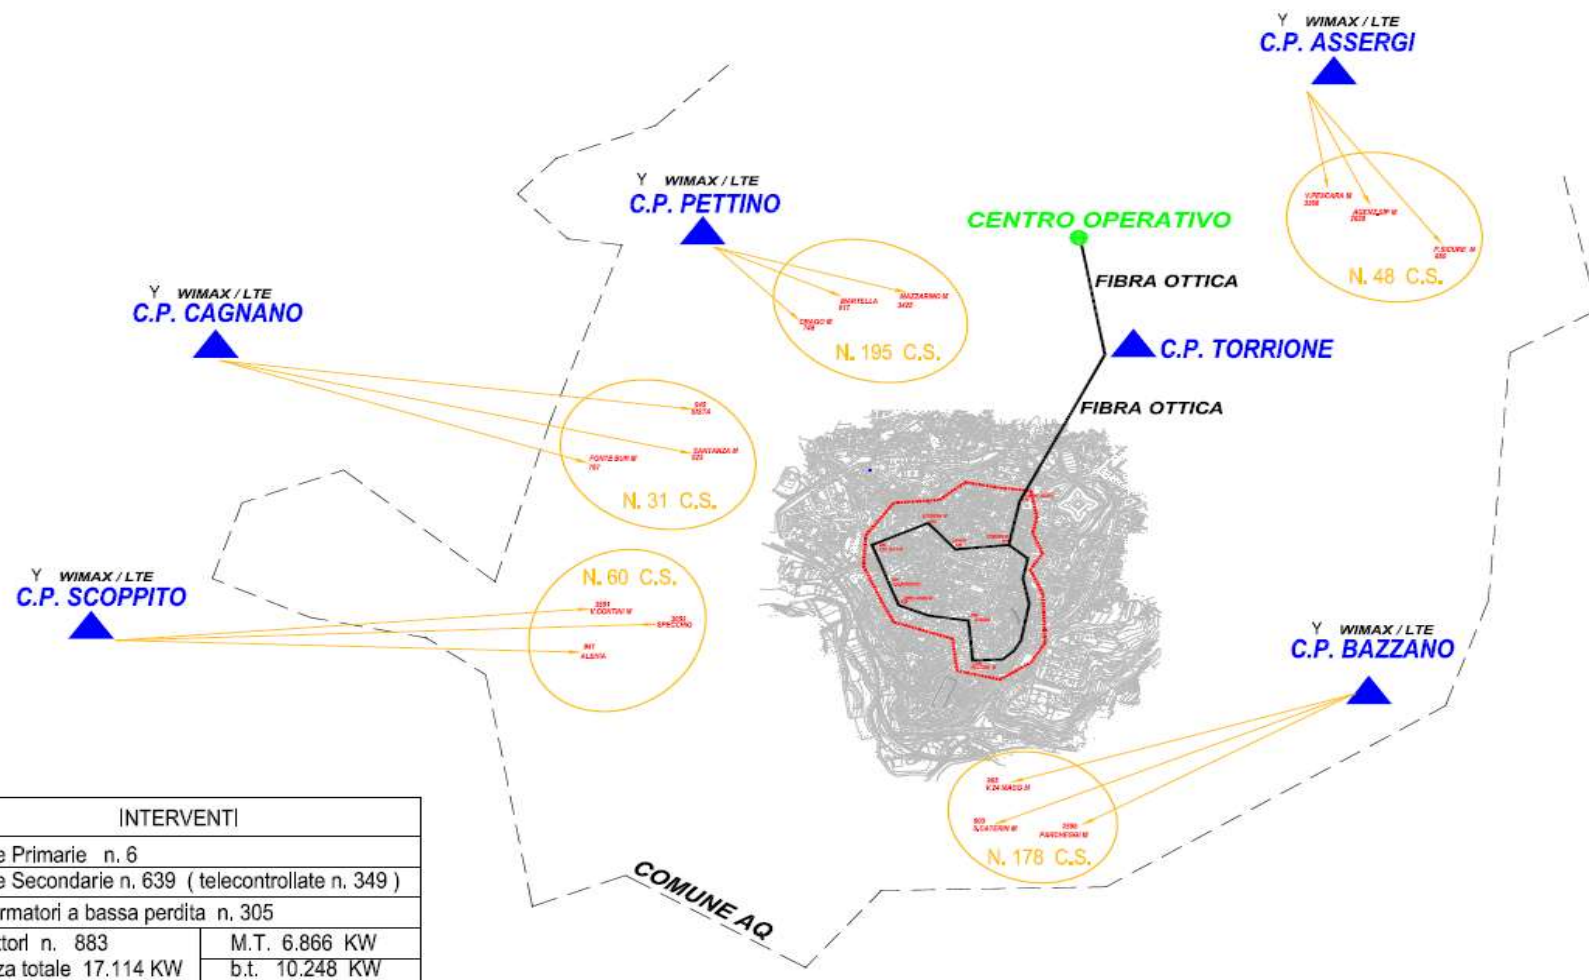

INTERVENTI	
Cabine Primarie n. 6	
Cabine Secondarie n. 639 (telecontrollate n. 349)	
Trasformatori a bassa perdita n. 305	
Produttori n. 883	M.T. 6.866 KW
Potenza totale 17.114 KW	b.t. 10.248 KW





- Gestione istruttorie delle pratiche di ricostruzione privata

dati al 4 aprile 2014	Vecchia procedura		Nuova procedura		Totale	
	n.	Importo (Milioni)	n.	Importo * (Milioni)	n.	Importo (Milioni)
totali, di cui	2.714	€ 1.400	1.384	€ 3.040	4.098	€ 4.440
istruttorie chiuse da USRA	651	€ 420	92	€ 343	743	€ 763

**importo totale stimato*


- Gestione della Commissione Pareri
- Semplificazione e miglioramento delle procedure interne ed aumento delle risorse disponibili (Abruzzo Engineering)

• CRITICITA'

Divisione del cratere in due Aree ciascuna con in proprio Ufficio Speciale per la Ricostruzione con diversi compiti e modalità operative ma stesso numero di risorse umane

Grande ritardo nella predisposizione delle integrazioni dei progetti

Situazione Ricostruzione

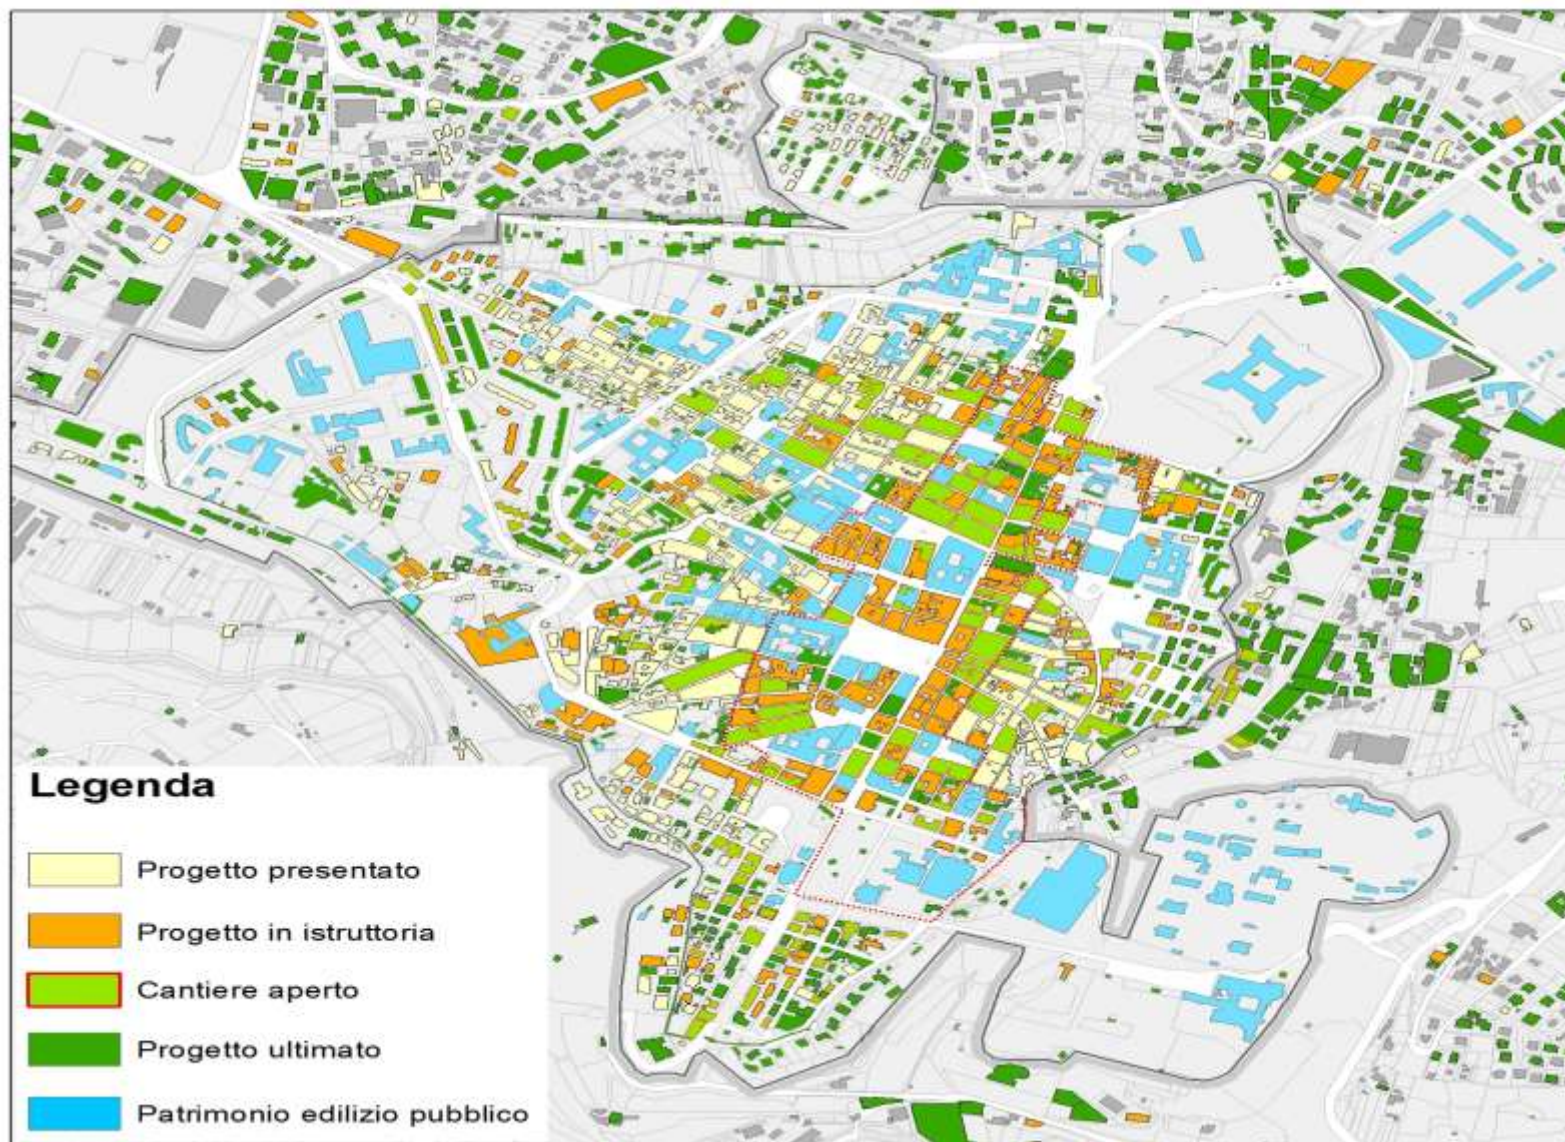

Altri dati chiave

Situazione alloggiativa

	lug-12			apr-14		
	Comune dell'Aquila	Altri comuni del Cratere*	Totale	Comune dell'Aquila	Altri comuni del Cratere*	Totale
Progetto C.A.S.E.	12.840	0	12.840	11.677	0	11.677
MAP (moduli abitativi provvisori)	2.762	4.178	6.940	2.459	4.178	6.637
Affitti fondo immobiliare e accordo quadro Barete	415	0	415	181	0	181
Affitti concordati con D.P.C.	557	233	790	4	233	237
Altre strutture comunali	0	63	63	0	63	63
Totale	16.574	4.474	21.048	14.321	4.474	18.795
Contributo autonoma sistemazione	9.608	1.351	10.959	4.030	231	4.261
Strutture ricettive di permanenza temporanea			282			143
Totale assistenza			32.289			23.199
Rientrate nella propria abitazione			35.170			44.260
Totale			67.459			67.459
<i>*dati aggiornati al luglio 2012</i>						

Situazione alloggiativa

ISTITUZIONE “WHITE LIST” O ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI

Attualmente sono in corso di istruttoria da parte di USRA e USRC circa **1.200** istanze di cui **730 progettisti e 470 imprese** per la formazione **dell’Elenco di operatori economici** interessati all’esecuzione degli interventi di ricostruzione.

I criteri che regolano l’inserimento degli operatori nell’elenco riguardano aspetti :

- **Amministrativi**
- **Relativi all’antimafia** (di competenza della Prefettura)
- di **affidabilità tecnica e qualitativa**, definiti anche tramite opportuni indicatori (ad esempio l’Indice di Rating per le imprese)

WHITE LIST



UFFICIO CENTRALIZZATO PER LE ESPROPRIAZIONI (UCE)

Procedure riguardanti: **6.000 particelle catastali**
20.000 intestatari

I costi

Ufficio
Centralizzato per
le Espropriazioni
(UCE)

PROGETTI	IMPEGNATI		PREVISTI				
	2013	2014	2014	2015	2016	TOTALE	
CASE	€ 25.439.262,39	€ 1.637.729,26	€ 40.000.000,00	€ 20.000.000,00	€ 5.000.000,00	€ 90.439.262,39	
MAP AQ	€ 532.393,95	€ 26.189,00	€ 10.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 4.000.000,00	€ 18.532.393,95	
MUSP AQ	€ 2.466.401,69	€ 2.223.843,60	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00	€ 500.000,00	€ 4.466.401,69	
CRATERE	ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 10.464,23	€ 1.000.000,00	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 1.600.000,00
	ESPROPRI	€ 4.852.461,13	€ 172.563,68	€ 9.000.000,00	€ 2.700.000,00	€ 2.700.000,00	€ 19.252.461,13
CAVE INERTI	€ 481.675,73	€ 0,00	€ 500.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 981.675,73	
G8	€ 1.808.853,19	€ 67.329,33	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.908.853,19	
ONERI FISCALI	€ 0,00	€ 510.000,00	€ 3.000.000,00	€ 2.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 6.000.000,00	
TOT	€ 35.581.048,08	€ 4.648.119,10	€ 64.600.000,00	€ 29.500.000,00	€ 13.500.000,00	€ 143.181.048,08	

- Tale attività consente di risparmiare sulle Indennità di occupazione pari a **700 mila di euro al mese**
- Maggiori tasse di registrazione, riduzione dei costi attesi rispetto ad una previsione iniziale di circa **180 milioni di euro**.

SVILUPPO

I) Potenziamento e rafforzamento della competitività del sistema industriale già presente nell'Area

SVILUPPO

Il **5% dei fondi** destinati alla ricostruzione è destinato allo **sviluppo**.

L'attuale stanziamento di **100 mln di euro** è volto a finanziare Assi di sviluppo che possano dare un respiro ampio alla città e un ruolo centrale all'Università, non solo come luogo di formazione, ma anche e soprattutto di ricerca.

GLI ASSI DI SVILUPPO:

I) **Potenziamento e rafforzamento della competitività del sistema industriale già presente nell'Area** (farmaceutico, aereospaziale, telecomunicazioni, avionica, tecnologie per la sicurezza)

Assegnazione: **55 milioni di euro**

I.a) progetti di investimento produttivo a forte contenuto di innovazione e con un potenziale di crescita elevato (**40 milioni di euro**)

I.b) progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale (**15 milioni di euro**)

SVILUPPO

II) Creazione e Sviluppo di nuove Attività imprenditoriali

II) Creazione e Sviluppo di nuove Attività imprenditoriali, per sostenere azioni di trasferimento tecnologico, per valorizzare le produzioni di eccellenza del territorio e promuovere le potenzialità del sistema turistico locale

Assegnazione: **45 milioni di euro**

II.a) progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di *spin off* per la ricerca, prioritariamente collegati alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le smart cities **(13 milioni di euro)**

II.b) investimenti per la valorizzazione turistica del patrimonio naturale, storico e culturale **(9 milioni di euro)**

II.c) progetti per la valorizzazione delle produzioni agroalimentari tipiche e di eccellenza **(3 milioni di euro)**

II.d) progetti per il rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso **(15 milioni di euro)**

II.e) attività di ricerca nell'ambito delle reti ottiche, dell'edilizia e del restauro e delle tecniche di recupero edilizio **(5 milioni di euro)**

SVILUPPO

Progetti che hanno raggiunto la conclusione dell'iter di finanziamento



Progetti che hanno già raggiunto la conclusione dell'iter di finanziamento:

II.d) Rilancio e potenziamento del polo di attrazione turistica del Gran Sasso

Assegnazione: **15 milioni di euro**

Ente coinvolto: Centro Turistico del Gran Sasso

II.e) Rete ottica innovativa per la Pubblica amministrazione

Assegnazione: **5 milioni di euro**

Ente coinvolto: Università degli Studi dell'Aquila



Rete ottica innovativa per la Pubblica amministrazione



NODI COINVOLTI:

Università degli Studi dell'Aquila

Sede di Coppito, Polo Umanistico, Palazzo Camponeschi, Palazzo Carli, Polo Didattico Via Di Vincenzo - ;

Tribunale; Corte d'Appello;

Provveditorato Opere Pubbliche;

Prefettura; Questura;

Amministrazione Comunale -

Palazzo Margherita, Sede Villa Gioia;

Amministrazione Provinciale -

Sede temporanea Via M.te Cagno,

Via S. Agostino, Nuova Sede ;

Agenzia delle Entrate; INPS;

Gran Sasso Science Institute; Ex-

Italtel;

Regione Abruzzo - Palazzo Centi,

Palazzo Silone, Palazzo dell'Emiciclo;

TAR; Biblioteca Provinciale; Vigili

del Fuoco; Plesso Scolastico Colle

Sapone Carabinieri (Piazza

D'Armi); **Guardia di Finanza**

(Piazza D'Armi)

Procedure di finanziamento in corso

MISE

Procedure di finanziamento in corso gestite dal Ministero per lo Sviluppo Economico:

I.a) progetti di investimento produttivo a forte contenuto di innovazione e con un potenziale di crescita elevato (Contratti di sviluppo)

I.b) progetti di ricerca industriale a prevalente sviluppo sperimentale

II.a) progetti per la nascita e lo sviluppo di nuove imprese innovative e di spin off per la ricerca, prioritariamente collegati alla realizzazione di infrastrutture innovative e servizi per le smart cities

CRITICITÀ: Ritardi nell'Attuazione degli interventi di sviluppo che comportano una valutazione complessivamente negativa

*Centro
TER.R.A.*

Il considerevole flusso di dati conoscitivi acquisito da USRA non può rimanere finalizzato esclusivamente alla mera determinazione del contributo concedibile per la ricostruzione.

Da questa considerazione è nata l'idea di avviare il progetto **centro TER.R.A.**

“Centro studi e documentazione del TERremoto e della Ricostruzione Aquilana”.

OBIETTIVO del **centro TER.R.A.** : la realizzazione di un sistema di condivisione dei dati per la memoria storica e per costituire la base conoscitiva per studi e la definizione delle politiche di intervento per la gestione delle calamita' naturali.





Ad oggi, **centro TER.R.A.** è una **rete virtuale aperta**, alla quale hanno aderito:

- *Ufficio speciale per la Ricostruzione dell'Aquila*
- *Ufficio speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere*
- *Direzione Regionale per i Beni Culturali*
- *Università degli Studi dell'Aquila*
- *Istituto per le Tecnologie Edilizie-Cnr*
- *Deputazione di Storia Patria negli Abruzzi.*



*Centro
TER.R.A.*

Presto, **centro TER.R.A.** diventerà anche uno **spazio fisico aperto a tutti**, e dove tutti potranno **verificare il processo della ricostruzione di questo territorio** - dall'emergenza alla quotidianità – e, in particolare, gli esiti dell'impegno profuso per ripristinare la vivibilità e la funzionalità della città di L'Aquila - capoluogo regionale, importante polo universitario, prezioso centro storico - in equilibrio tra la conservazione dei propri caratteri identitari e le sfide necessarie per diventare una città moderna e tecnologicamente avanzata.
